Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0		**BP CALLE 61 NQS**	**91 días**	**lun 2/03/26**	**lun 15/06/2**
1		INCIO	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26
2	**1**	**ACTIVIDADES DE GESTION AMERICAS CON 26**	**30 días**	**lun 2/03/26**	**sáb 4/04/26**
3	1.1	TRAMITE ADMISTRATIVO	10 días	lun 2/03/26	jue 12/03/26
4	1.2	TRAMITE LEGAL	10 días	vie 13/03/26	mar 24/03/2
5	1.3	AUTORIZACION AUTOMATICA	5 días	vie 13/03/26	mié 18/03/26
6	1.4	AUTORIZACION LEGAL	5 días	mié 25/03/2	lun 30/03/26
7	**2**	**URBANISMO**	**71 días**	**mié 25/03/2**	**lun 15/06/26**
8	2.1	**PRELIMINARES**	0 días	mié 25/03/2	mié 25/03/26
9	2.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26
10	2.3	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	12 días	vie 27/03/26	jue 9/04/26
11	2.4	DEMOLICIÓN DE ANDÉN E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	10 días	vie 10/04/26	mar 21/04/26
12	2.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	10 días	mié 22/04/2	sáb 2/05/26
13	2.6	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO B200	5 días	lun 4/05/26	vie 8/05/26
14	2.7	**ELEMENTOS URBANOS**	0 días	sáb 2/05/26	sáb 2/05/26
15	2.8	BANCAS EN LADRILLO SEMI-PRENZADO CON DOBELAS EN CONCRETO, IMPERMEABILIZADAS 2x4	18 días	lun 4/05/26	sáb 23/05/26
16	2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE CIBERSEGURIDAD CIRCUITO CERRADO INCLUIDO CONECTIVIDAD WIFI	12 días	lun 4/05/26	sáb 16/05/26
17	2.10	**PISOS Y ACABADOS ARQUITECTONICOS**	0 días	mié 25/03/2	mié 25/03/26
18	2.11	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8") h=1.8 m	25 días	lun 4/05/26	lun 1/06/26
19	2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PARA EXTERIORES FORMATO 15X18, COLOR TERRACOTA.	15 días	lun 4/05/26	mié 20/05/26
20	2.13	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE DATOS**	0 días	mié 25/03/2	mié 25/03/26
21	2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA AÉREA, CONEXIÓN DESDE RED TRENZADA DE B.T., BAJANTE HACIA EQUIPO DE MEDIDA EN TUBO IMC DE 1".	2 días	mar 2/06/26	mié 3/06/26
22	2.15	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA DOBLE INCLUYE APARATO NO INCLUYE CABLE	4 días	jue 4/06/26	lun 8/06/26
23	2.16	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LINEAL LED COMERCIAL 40 W LUZ DIA NO INCLUYE CABLE	6 días	mar 9/06/26	lun 15/06/26
24	2.17	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS**	0 días	mié 25/03/2	mié 25/03/26
25	2.18	PAGO ACOMETIDA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2 días	vie 27/03/26	sáb 28/03/26
26	2.19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA HIDRÁULICA HIDRAULICO 1/2" DE DISTRIBUCIÓN	8 días	mié 8/04/26	jue 16/04/26
27	2.20	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA SANITARIA DE RECOLECCIÓN 3"	6 días	vie 17/04/26	jue 23/04/26
28	2.21	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	8 días	lun 30/03/26	mar 7/04/26
29	2.22	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO B200	8 días	mié 8/04/26	jue 16/04/26
30	2.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUARTO PA	4 días	lun 30/03/26	jue 2/04/26
31	2.24	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS**	0 días	mié 25/03/2	mié 25/03/26
32	2.25	RETIRO DE ESCOMBROS	1 día	vie 3/04/26	vie 3/04/26
33	2.26	ASEO FINAL	1 día	sáb 4/04/26	sáb 4/04/26
34	**3**	**MODULO TIENDAS**	**52 días**	**mié 25/03/2**	**sáb 23/05/26**
35	3.1	**PRELIMINARES**	0 días	mié 25/03/2	mié 25/03/26
36	3.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	2 días	mié 25/03/2	jue 26/03/26
37	3.3	DEMOLICIÓN DE ANDÉN E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	10 días	vie 27/03/26	mar 7/04/26
38	3.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	10 días	mié 8/04/26	sáb 18/04/26
39	3.5	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**	0 días	sáb 18/04/26	sáb 18/04/26
40	3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE DADOS EN CONCRETO SIMPLE DE 4000 PSIDE 30X30 CMS	12 días	lun 20/04/26	sáb 2/05/26
41	3.7	CONCRETO SIMPLE DE 28 Mpa. (4000 PSI)	8 días	lun 20/04/26	mar 28/04/26
42	3.8	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO B200	8 días	mié 29/04/2	jue 7/05/26
43	3.9	**ESTRUCTURA METALICA**	0 días	mié 25/03/2	mié 25/03/26
44	3.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	25 días	vie 27/03/26	vie 24/04/26
45	3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	8 días	sáb 25/04/26	lun 4/05/26
46	3.12	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN PERFILERIA METALICA, TEJA UPVC COLOR SEGÚN DISEÑO ESPESOR 6 MM.	12 días	sáb 25/04/26	vie 8/05/26
47	3.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 D=0.75 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO	10 días	sáb 25/04/26	mié 6/05/26
48	3.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA EN SUPERBOARD DE 10 MM	10 días	sáb 9/05/26	mié 20/05/26
49	3.15	Suministro e instalación de lámina microperforada en acero galvanizado	4 días	mar 5/05/26	vie 8/05/26
50	3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN 60 CM ANCHO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 CON SOPORTES Y ANGULOS A=45 CM, PINTURA ELECTROSTÁTICA	3 días	jue 21/05/26	sáb 23/05/26
51	3.17	POCETA EN LADRILLO Y ENCHAPE DE 0.6 m * 0.4 m	3 días	jue 21/05/26	sáb 23/05/26
52	3.18	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26
53	3.19	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE ILUMINACION	4 días	jue 7/05/26	lun 11/05/26
54	3.20	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR	4 días	jue 7/05/26	lun 11/05/26
55	3.21	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA DOBLE INCLUYE APARATO	4 días	jue 7/05/26	lun 11/05/26
56	3.22	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LINEAL LED COMERCIAL 40 W LUZ DIA	6 días	jue 7/05/26	mié 13/05/26
57	3.23	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS E HIDRAULICAS**	0 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26
58	3.24	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE	6 días	jue 7/05/26	mié 13/05/26
59	3.25	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO 1/2"	6 días	jue 7/05/26	mié 13/05/26
60	3.26	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS**	0 días	mié 13/05/2	mié 13/05/26
61	3.27	RETIRO DE ESCOMBROS	2 días	jue 14/05/26	vie 15/05/26
62	3.28	ASEO FINAL	2 días	sáb 16/05/26	lun 18/05/26
63	**4**	**MODULO BAÑOS**	**40 días**	**mié 25/03/2**	**sáb 9/05/26**
64	4.1	**PRELIMINARES**	0 días	mié 25/03/2	mié 25/03/26
65	4.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	1 día	mié 25/03/2	mié 25/03/26
66	4.3	DEMOLICIÓN DE ANDÉN E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	4 días	jue 26/03/26	lun 30/03/26
67	4.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	4 días	mar 31/03/2	vie 3/04/26
68	4.5	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**	0 días	mié 25/03/2	mié 25/03/26
69	4.6	PLATINAS ENVEVIDAS DE SOPORTE PARA COLUMNAS DE ACERO	3 días	sáb 4/04/26	mar 7/04/26
70	4.7	CONCRETO SIMPLE DE 28 Mpa. (4000 PSI)	4 días	mié 8/04/26	sáb 11/04/26
71	4.8	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO B200	2 días	mié 8/04/26	jue 9/04/26
72	4.9	POCETA EN LADRILLO Y ENCHAPE DE 0.6 m * 0.4 m	3 días	lun 13/04/26	mié 15/04/26
73	4.10	**ESTRUCTURA METALICA**	0 días	mié 25/03/2	mié 25/03/26
74	4.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA INCLUYE PEDESTAL	11 días	sáb 4/04/26	jue 16/04/26
75	4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	4 días	vie 17/04/26	mar 21/04/26
76	4.13	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN PERFILERIA METALICA, TEJA UPVC COLOR SEGÚN DISEÑO	6 días	mié 22/04/26	mar 28/04/26
77	4.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 D=0.75 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO	4 días	mié 29/04/26	sáb 2/05/26
78	4.15	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA EN SUPERBOARD DE 10 MM	4 días	mié 29/04/26	sáb 2/05/26
79	4.16	SUMINISTRO E INSTALACION PISO CERÁMICA BLANCO 50X50	4 días	lun 4/05/26	jue 7/05/26
80	4.17	REJILLA DE VENTILACION 20X50 CM	2 días	lun 4/05/26	mar 5/05/26
81	4.18	Camerino individual para cambio de ropa, con estructura metálica, puerta metálica con cerradura, banco interior y accesorios. Incluye materiales, mano de obra 1.20*1.20 m	6 días	vie 17/04/26	jue 23/04/26
82	4.19	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	0 días	mié 25/03/2	mié 25/03/26
83	4.20	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE ILUMINACION	3 días	lun 4/05/26	mié 6/05/26
84	4.21	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR	3 días	lun 4/05/26	mié 6/05/26
85	4.22	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA DOBLE INCLUYE APARATO	3 días	lun 4/05/26	mié 6/05/26
86	4.23	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LINEAL LED COMERCIAL 40 W LUZ DIA	3 días	lun 4/05/26	mié 6/05/26
87	4.24	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS E HIDRAULICAS**	0 días	mié 25/03/26	mié 25/03/26
88	4.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AHORRADOR CON ACOPLE	3 días	lun 4/05/26	mié 6/05/26
89	4.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INFANTIL LINEA INSTITUCIONAL. (INCLUYE ACCESORIOS)	3 días	lun 4/05/26	mié 6/05/26
90	4.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES Y ESPEJO PARA BAÑO	3 días	lun 4/05/26	mié 6/05/26
91	4.28	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO 1/2"	4 días	lun 4/05/26	jue 7/05/26
92	4.29	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS SENCILLO CON ACOPLE	2 días	lun 4/05/26	mar 5/05/26
93	4.30	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS**	0 días	mié 25/03/2	mié 25/03/26
94	4.31	RETIRO DE ESCOMBROS	2 días	mié 6/05/26	jue 7/05/26
95	4.32	ASEO FINAL	2 días	vie 8/05/26	sáb 9/05/26
96		FIN	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26

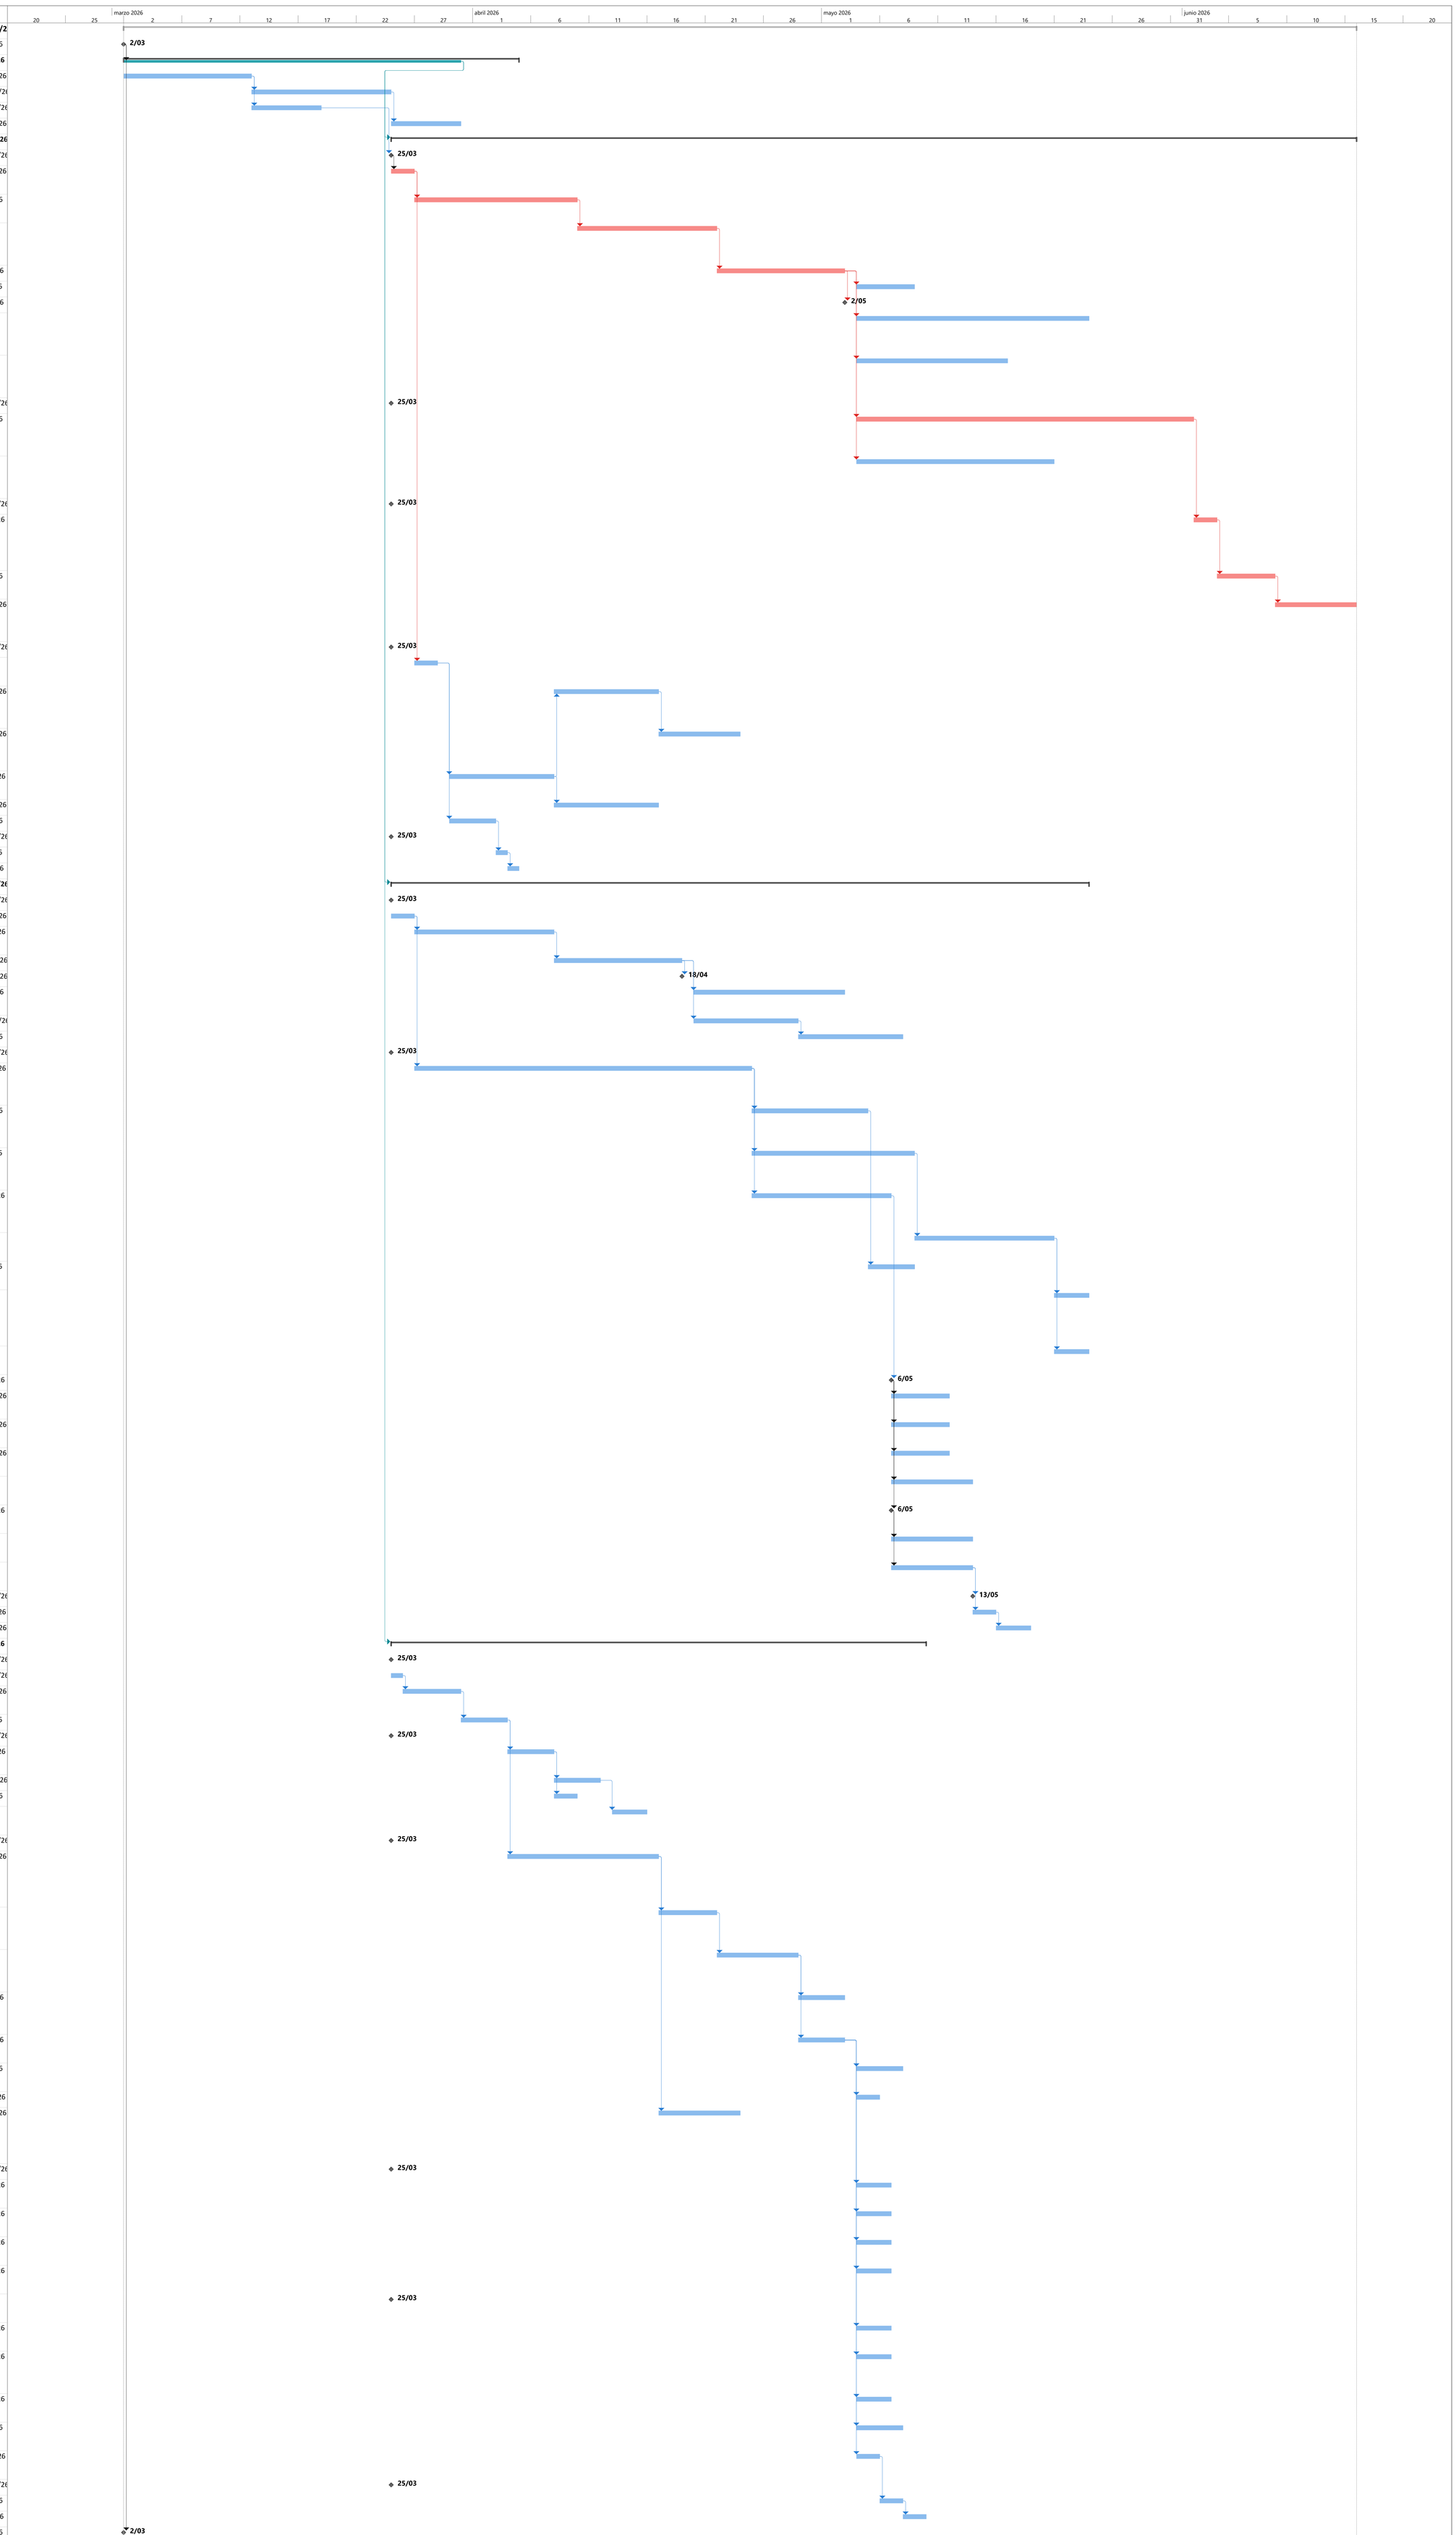

Proyecto: BP CALLE 61 NQS
Fecha: mar 10/02/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso
